Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves
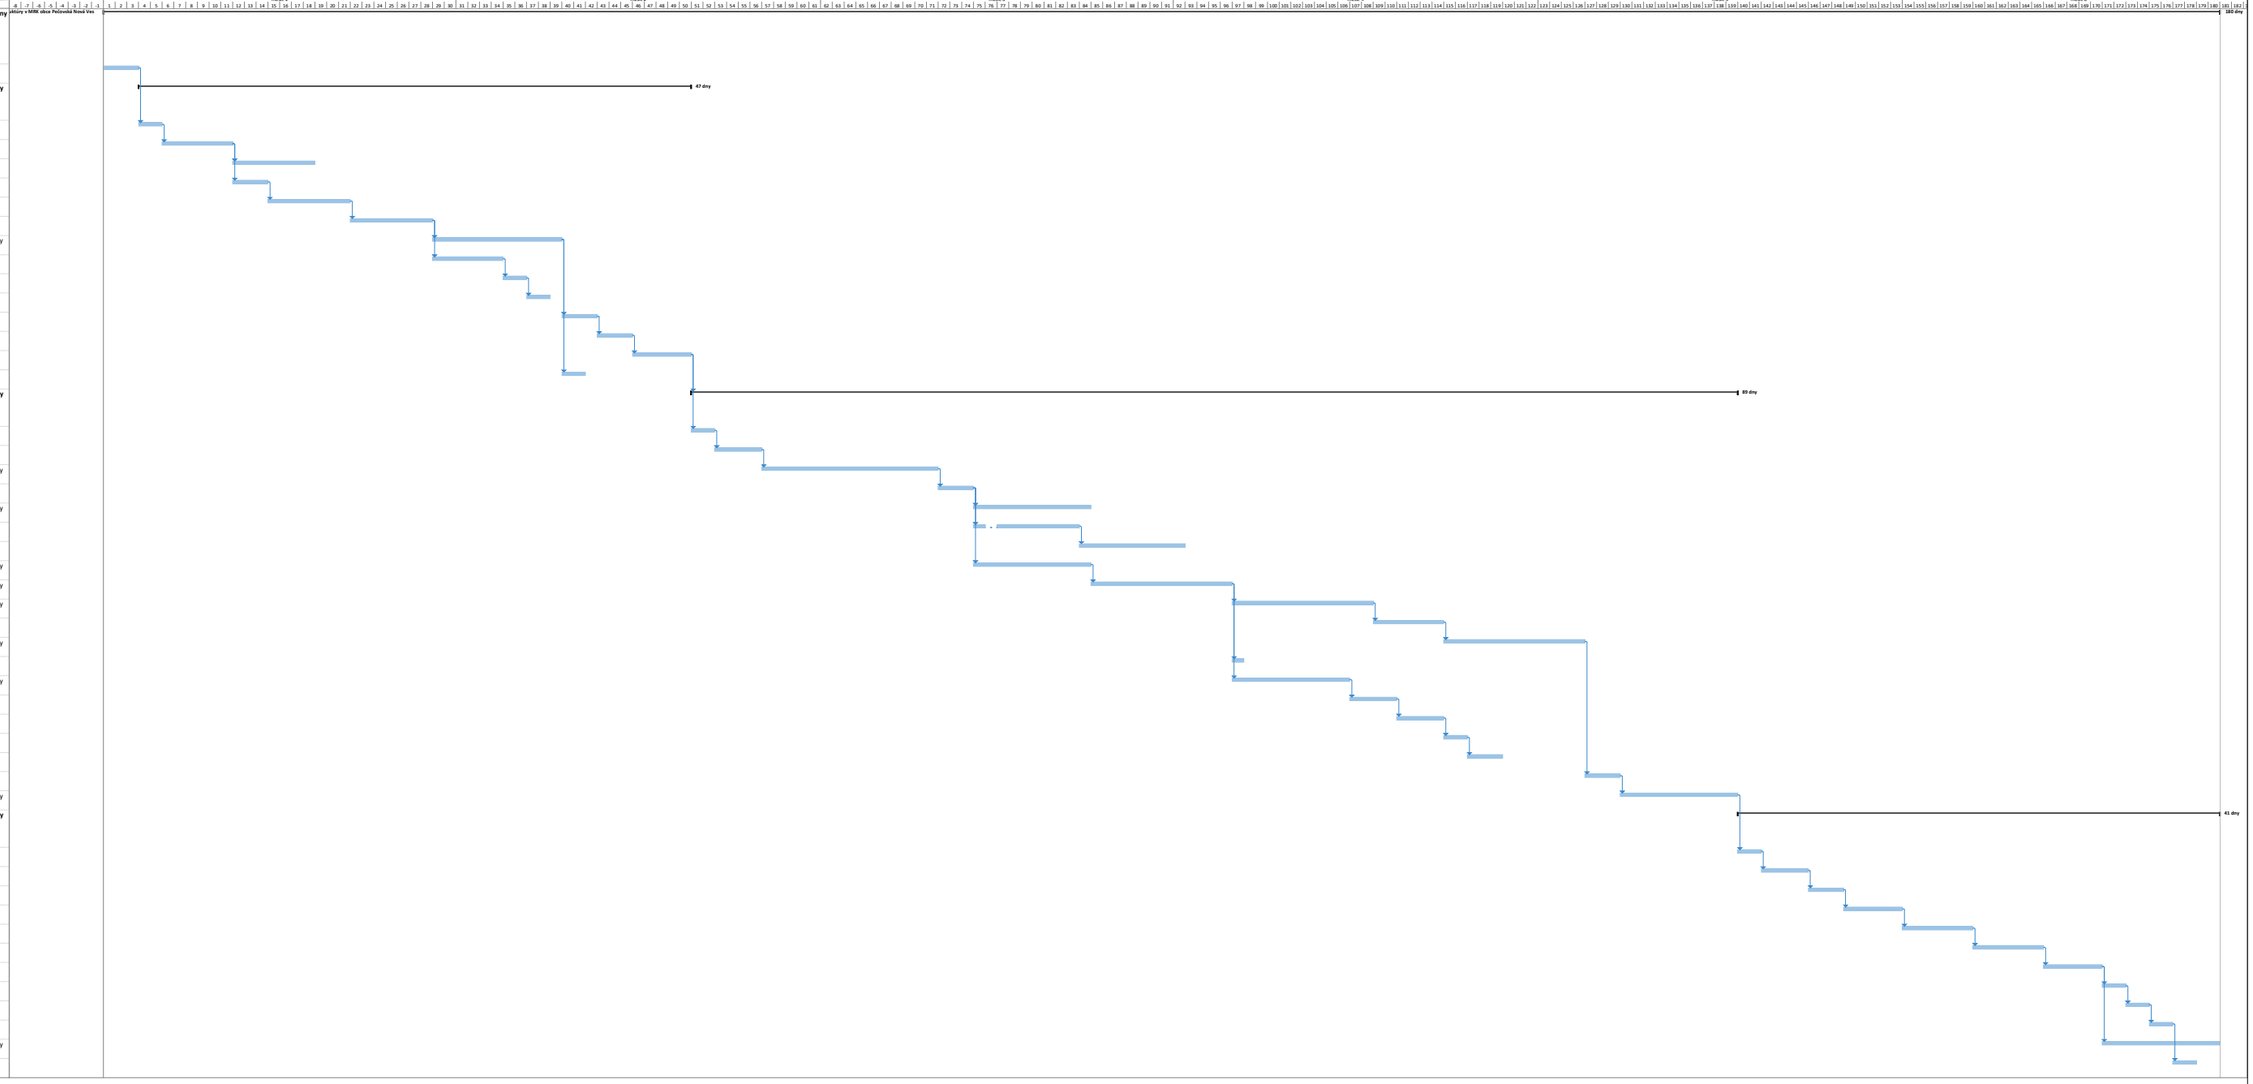
ID	Názov úlohy	Doba trvání
1	**Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves**	**180 dny**
2	Zriadenie staveniska, vytyčovanie,	3 dny
3	**SO 01 - Miestna komunikácia k Židovskému cintorínu v Pečovskej Novej vsi**	**47 dny**
4	Vytyčovanie	2 dny
5	Okopávka cesty	6 dny
6	Drenáže DN 160 - výkop, pokládka, obsy	7 dny
7	Úprava pláne	3 dny
8	Podklad kamenivo	7 dny
9	Pokládka dláždeného rigolu a štrbinovéh	7 dny
10	Zhotovenie odvodnenia DN 200, RN, VO	11 dny
11	Podklad 0/32	6 dny
12	Asfalty AC 16	2 dny
13	Asfalty AC 11	2 dny
14	Krajnica	3 dny
15	Osadenie ZDZ	3 dny
16	rozprestretie ornice,Vegetačné úpravy	5 dny
17	Subdodávka zábradlie	2 dny
18	**SO 02 - Prestavba miestnnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi**	**89 dny**
19	Vytýčenie	2 dny
20	odstránenie ornice	4 dny
21	odkopy, použitie na násyp pod chodník	15 dny
22	úprava pláne	3 dny
23	podklady	10 dny
24	násyp pod chodník dovoz zeminy	8 dny
25	Verejné osvetlenie	9 dny
26	Podklad kamenivo	10 dny
27	Osadenie cestného obrubníka	12 dny
28	Osadenie záhonového obrubníka	12 dny
29	Podklad zámková dlažba 0/32 hr. 20 cm	6 dny
30	Pokládka zámkovej dlažby	12 dny
31	Frézovanie na KÚ a ZÚ	1 den
32	Podklad 0/32	10 dny
33	Asfalty AC 16	4 dny
34	Asfalty AC 11	4 dny
35	Zálievka	2 dny
36	Realizácia VDZ	3 dny
37	Osadenie ZDZ	3 dny
38	rozprestretie ornice,Vegetačné úpravy	10 dny
39	**SO 03 - Udržiavacie práce spevnených plôch na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi**	**41 dny**
40	vytýčenie	2 dny
41	vytrhanie obrubníkov, odkopy, ornica	4 dny
42	úprava pláne, geotextília	3 dny
43	poklady	5 dny
44	Osadenie cestného obrubníka	6 dny
45	Osadenie záhonového obrubníka	6 dny
46	Podklad chodník asfaltovy	5 dny
47	Podklad 0/32	2 dny
48	Asfalty AC 16	2 dny
49	Asfalty AC 11	2 dny
50	rozprestretie ornice,Vegetačné úpravy	10 dny
51	VDZ	2 dny
